

## 淀江産業廃棄物管理型最終処分場建設工事の進捗状況について

## センター処分場建設工事の進捗状況について

(公財)鳥取県環境管理事業センター

## 1 準備工

## ■ 下流水路改修工事

概要：林地開発許可条件への対応のための計画地下流部の水路の流路断面の拡幅工事  
 状況：工事中（令和8年2月～8月までの予定）

## 2 処分場造成工


## ■ 処分場の本体工事

概要：第1期部の埋立地、集排水施設、遮水工、地下水モニタリング井戸の設置工事  
 状況：令和7年11月に入札公告を行ったが、入札不落。現在、対応検討中。

## ■ 浸出水処理施設等建設工事

概要：浸出水処理施設、併設の管理場事務所、計量棟の建設工事  
 状況：令和7年11月に入札公告を行ったが、応募者無しで入札不調。現在、対応検討中。

## 準備工・下流水路改修工事

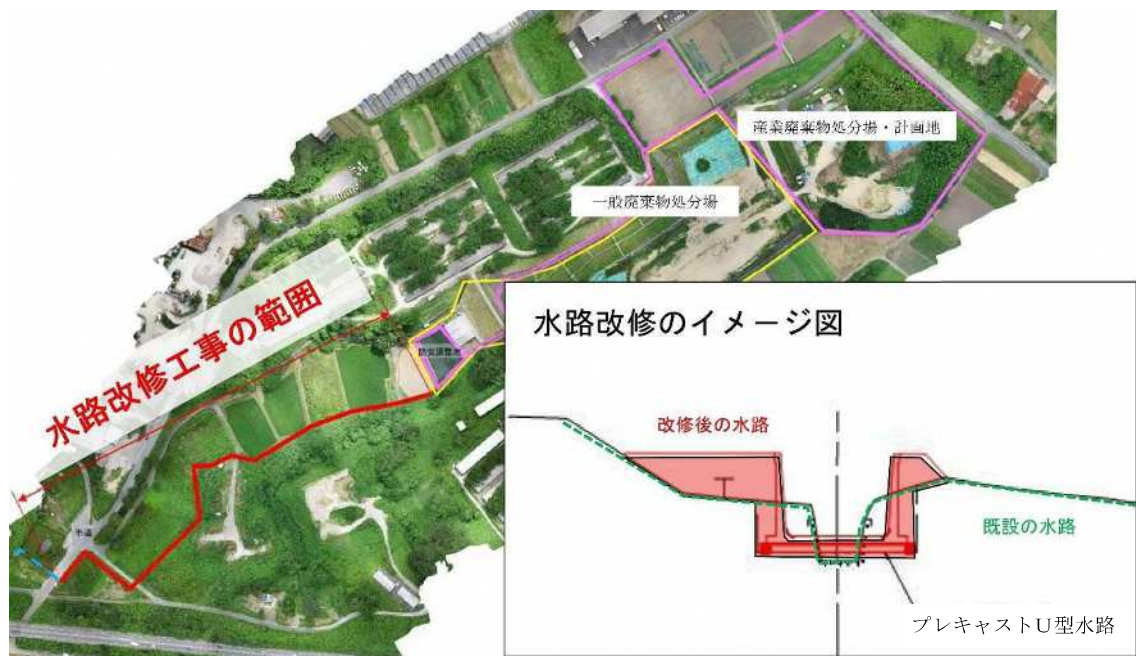



### 3 関連工

#### ■ 基礎地盤造成工事

概要：産廃埋立部法面の基礎地盤となる隣接一廃最終処分場えん堤下部の地盤強化工事  
→ 埋立済の廃棄物の置換・転圧によって、対象箇所の地盤強化を図る。

状況：工事中（令和7年11月～令和8年6月までの予定）

#### 関連工・基礎地盤造成工事

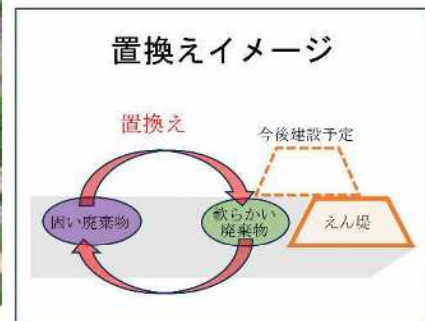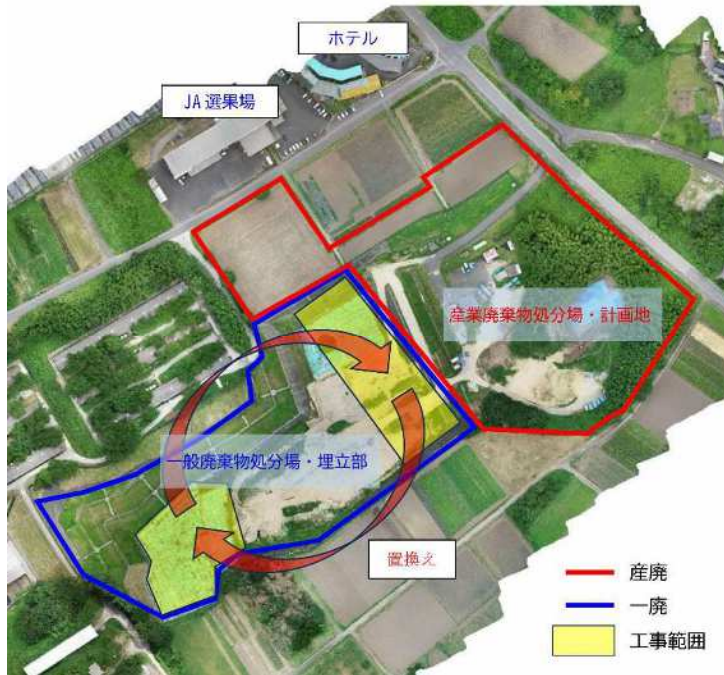

#### (断面イメージ)

