海坂道路II 其I NEWS

第12号

令和3年3月25日(木) 発行 【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所

浜坂道路第1課·第2課·設備課 TEL:0796(82)5695 浜坂道路用地対策課 TEL:0796(82)5685


工事進捗状況についてお知らせいたします。来年度も工事進捗に邁進してまいります。引き続きご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

居組地区

IC正面の山の 木の伐採が完 了し、法面掘 削箇所までの 工事用道路の 設置に取り掛 かり順次法面 掘削を行って いるところで す(1)。

来年度も引 き続きIC入口周 辺の山の法面 掘削工事を 行っていく予 定です。

居組IC

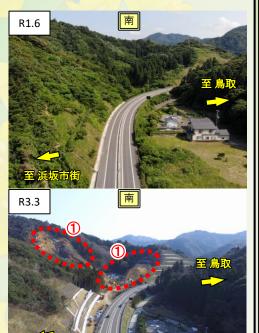

2月末で工事用道路の 設置が完了しました。

来年度は切土工事、橋 台・橋脚工事に着手予定



3月で県道拡幅工事 が完了します。

来年度は、JR高架下 の拡幅工事や橋脚工事、 大栃川を渡る仮橋設置 工事に着手する予定で



供用中のインター内では橋台を支える 地中の杭の施工が完了しました。今後は 地上部の橋台本体の工事を行います(1)。

国道178号西側では引き続き工事用道 路や圃場水路の整備等を行います(2)。

また、来年度は橋脚の工事に着手する とともに、戸田地区においてトンネルエ 事にも着手します。





浜坂道路Ⅱ期 延長 L=7.6km

居組大橋 釜屋第1橋(仮称)L=64m 釜屋第2橋(仮称)L=31m

諸寄高架橋 (仮称)L=306m

下部工施工中

栃谷高架橋 (仮称) L=251m



居組トンネル(仮称) L=1.340m

新釜屋 トンネル (仮称) L=1,067m

(仮称) L=185m

釜屋地区

|新諸寄第2トンネル| 新諸寄第1トンネル (仮称) L=79m

浜坂第2トンネル(仮称) L=2.800m

浜坂第1トンネル (仮称) L=223m

道路事業の流れ

供 用 用 現 地幅拉 地 用 測 開

【浜坂道路フェイスブック】 浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や 新温泉土木事務所のトピックス等を 掲載していますので、ぜひご覧下さい。 https://www.facebook.com/shinonsen



山陰近畿自動車道

~ジオパークロード~

岩美道路 ĀĒWS



令和3年3月発行 第4号

【お問合せ】鳥取県鳥取県土整備事務所 山陰道•岩美道路推進室

0857-20-3612 • 3614

【①牧谷トンネルの進捗状況】

安全祈願祭が行われ、いよいよトンネル掘削が本格化します!







令和3年3月22日、牧谷トンネル工事の無事貫通を祈願して、安全祈願祭が執り行われ ました。今回の安全祈願祭は、新型コロナ対策のため、三密を避け、受注者と発注者のみで の実施となりました。

牧谷トンネルは、岩美IC~東浜IC(延長5.7km)に計画されている3本のトンネル(東浜トン ネル、牧谷トンネル、道竹城トンネル)のうち、最後に施工するトンネルであり、岩美町牧 谷地内の山地を貫く延長412mの大断面トンネルです。

トンネル掘削工事は令和2年10月に契約し、施工ヤードの整備や吹付プラント等の仮設 備の整備を進めてきました。現地では、ドリルジャンボや吹付機などの機械や使用する資材 の準備も万端です。坑口処理を終え、いよいよ令和3年4月から本格的にトンネル掘削開始 となります。工事が順調に進めば、令和3年10~11月頃にトンネル貫通予定です!



【②日野谷工区・牧谷トンネル完成イメージ】





【岩美道路ホームページ/インスタグラム】

岩美道路の概要や進捗状況、最新のピックなどをホームページのほか、 インスタグラムでの掲載を始めました!!こちらも、ぜひご覧ください!!



Instagram
