

岩美海岸(浦富地区)の浜崖状況と今後の予定について



<これまでの経過>

- ・平成30年11月 サンドバック(東側・西側)施工
- ・令和2年度及び令和3年度の冬季風浪にて浜崖の後退が進行
- ・必要に応じてサンドリサイクル等で応急対応





<令和7年12月の人工リーフ開口部背後の浜崖状況>



岩美海岸(浦富地区)の浜崖状況と今後の予定について

<今後の予定について>

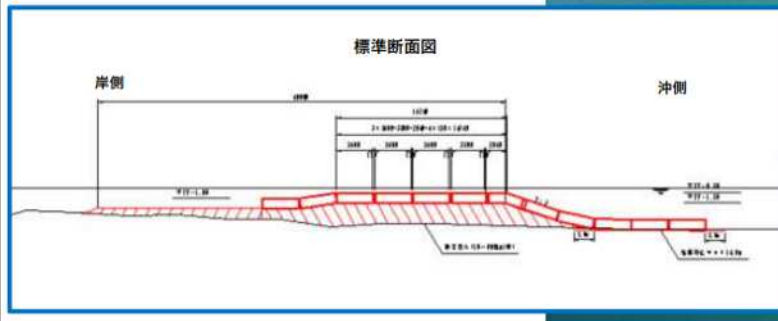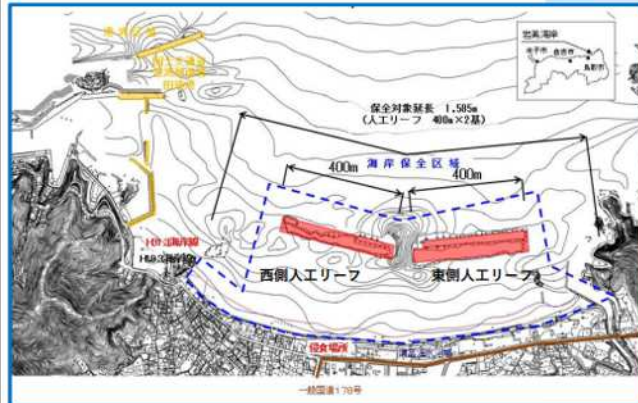

- ・令和4年9月の人工リーフ完成後2～3年間のモニタリングの結果を踏まえ、人工リーフ整備の効果検証を行う。(令和7年度実施中)
- ・効果検証を踏まえ、効果的なサンドリサイクル養浜位置の検討、浜崖対策の詳細設計を実施する。(令和8年度)
- ・岩美海岸(陸上地区)のサンドバック整備が完成する頃に、浦富地区の浜崖対策工事に着手する。(令和10年度)
- ・浜崖の経過観察(月2回程度の巡視、3ヶ月に1回程度のドローン写真撮影)を継続し、状況に応じて応急対応を実施する。(毎年)

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度～
岩美海岸(浦富地区)	人工リーフ整備	完成						
	人工リーフ効果検証・ 浜崖対策工設計	人工リーフ効果検証のためのモニタリング期間						
	浜崖応急対策 ※状況に応じて							
	浜崖対策工整備							
岩美海岸(陸上地区)	サンドバック整備							完成(予定)
