

境港公共マリーナの砂堆砂対策について

令和7年12月16日
境港管理組合

1 堆砂対策の取組み背景

- 弓ヶ浜海岸末端部に位置し、例年漂砂により航路が埋没。
- 航路維持のため、国交省の養浜と連携したサンドリサイクル事業により、毎年浚渫を実施。
- 平成26年2月の関東沖の爆弾低気圧で東よりの強風が続き、航路が埋没、船舶の入出港が困難となった。


2 境港公共マリーナの状況

- 平成30年度～令和元年度、「2019(R1)レーザー級世界選手権」に合わせ、マリーナ周辺の施設改修。
- 令和3年4月「さかいみなと海の駅」として海の駅に認定。
- 令和4年4月 境港公共マリーナ整備事業着手
- 令和4年11月 日本オリンピック委員会の強化センターに再認定。
- 令和5年9月 港湾計画に基づいた境港公共マリーナ整備事業実施に伴い、「第1回夢みなとエリア再整備検討会」を開催。
- 令和5年5月、7月 セーリング競技の日本代表強化合宿を実施。11月23～26日 全日本大会「2023(R5)Laser All Japan Championships ILCA6/7」開催。
- 令和6年3月「第2回夢みなとエリア再整備検討会」、9月「第3回夢みなとエリア再整備検討会」を開催。
- 令和6年4月、10月、11月 セーリング競技のHOPEユース強化合宿を実施。
- 令和7年6月第65回中国高等学校ヨット選手権大会を開催



3 堆積土砂量の推移

- 弓ヶ浜海岸(米子市夜見、富益地内等)は、美保湾を北に向かう沿岸漂砂により侵食され、流末(北側末端部)に位置する境港公共マリーナ付近に堆積し、航路・泊地が埋没している。
- 境港公共マリーナの航路・泊地に堆積した土砂について、境港管理組合が浚渫して陸上げし、国土交通省日野川河川事務所が自らの採取土砂と併せてダンプトラックで運搬、侵食が進む米子市富益地区等の弓ヶ浜海岸の浜崖部に養浜するサンドリサイクル事業を実施している。

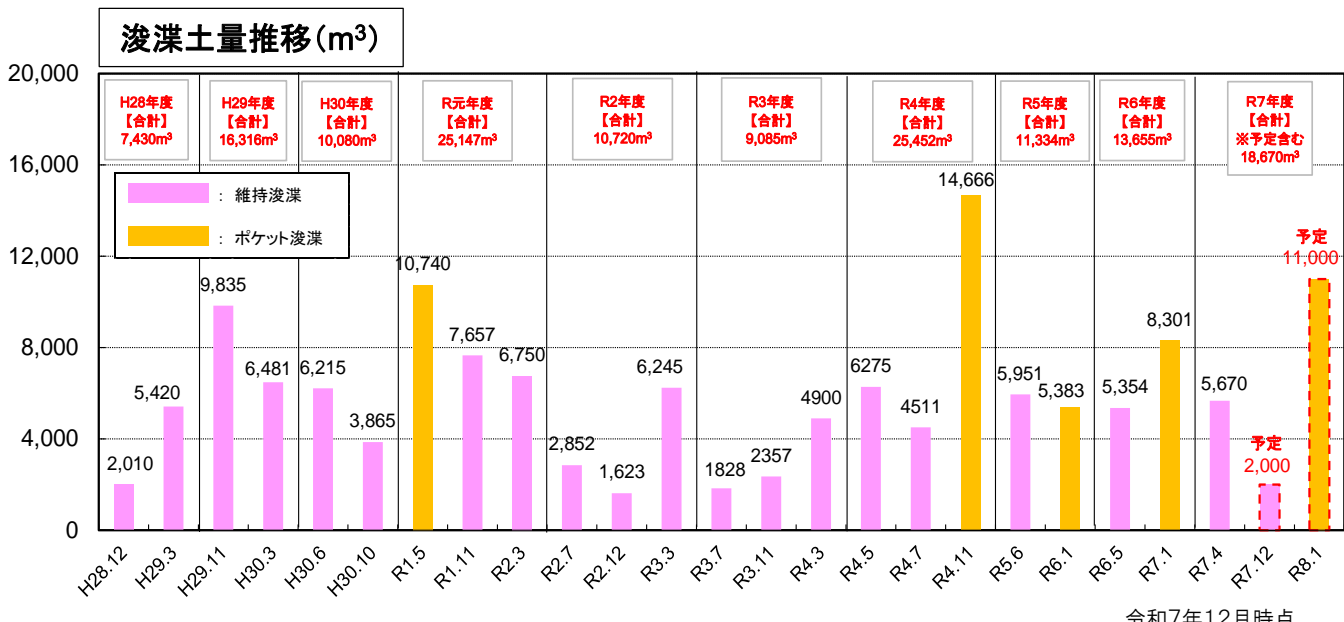

4 近年の取組状況

- 令和元年度
 - ・6月 南側砂浜海岸の状況をリアルタイムで把握し、当該海岸の適切な維持管理や安全にマリーナをご利用いただくためのツールとして海岸監視カメラを設置。
 - ・3月 境港長期構想を策定。
- 令和3年度
 - ・7月 境港港湾計画を16年ぶりに改訂。
現マリーナを東側へ拡張し、機能移転・拡充を含めた整備を計画。
- 令和4年度
 - ・4月 港湾計画に基づき、境港公共マリーナ整備事業スタート。
 - ・11月 航路背後地の土砂堆積が著しいため、ポケット部の浚渫実施。
- 令和5年度
 - ・9月 境港公共マリーナの深淺測量、地質調査が完了。
- 令和6年度
 - ・8月 マリーナ拡張整備に係る工事に着手。
 - ・1月 ポケット部の浚渫実施。
- 令和7年度
 - ・1月 ポケット部の浚渫予定(令和9年まで毎年度実施予定)。



5 境港公共マリーナ整備事業

- 事業目的
 - ・「海洋性レクリエーション需要への対応」、「港内の放置艇対策」及び「航路埋塞対策」
- 事業名
 - ・外港竹内南地区公共マリーナ整備事業
- 事業期間
 - ・令和4年度～令和13年度(予定) ※令和12年度(2030)島根国スポ、令和15年度(2033)鳥取国スポ
- 全体事業費
 - ・C=31億円(予定)
- 事業内容
 - ・防波堤延長:375m
- 事業の進捗状況
 - 【工事】
 - ・令和7年度 沖側防波堤据付工事を実施中。
 - 令和8年度 沖側防波堤据付工事を継続予定。
 - ・引き続き関係者と意見交換を行いながら拡張工事を進めます。



境港公共マリーナ拡張計画(整備イメージ)
