

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月06日

計画の名称	鳥取県共生社会実現に向けた誰もが集える安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	鳥取県												
計画の目標	鳥取県立布勢総合運動公園は、公園内の運動施設を活かした各種スポーツ大会・キャンプ誘致や、市内の宿泊施設と連携した学生・社会人の合宿誘致等を推進している一方で、各運動施設は広く県民に開放され、気軽な生涯スポーツ利用でも日常的に親しまれている。しかしながら開園後30年以上経過する等施設の旧式化は否めず、また園内の地形的高低差から生じる移動時の問題もあり、バリアフリー化は決して充分ではない。これらの課題を解決し、キャンプや競技の観戦を通じて更なるスポーツの裾野拡大と高齢者や障がい者を含む多様な公園利用を促進するため、誰もが園内のどこでも円滑に使用可能となるよう、障がい者・高齢者のスポーツ利用や観戦等にも配慮した既存公園施設のバリアフリー化整備を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	490	A	490	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	公園施設(園路及び広場、駐車場、便所、運動施設、等)のバリアフリー化率（H27実績 45% → H30 60%） 円滑な公園利用を目的とした公園施設のバリアフリー化目標達成（%） 園路及び広場、駐車場、便所、運動施設、等のバリアフリー化実績を基に目標値を算定する。	45%	50%	60%
2	公園施設のバリアフリー化により施設利用料免除対象となる公園利用者(障がい者や高齢者等)実績（H27実績 212千人 → H30 256千人） 障がい者や高齢者等利用料免除対象となる公園利用者数の目標達成（人） 集計値がある平成26～27年度間での減免利用者数年度実績の対前年度伸び率を基に目標値を算定する。	212千人	228千人	256千人

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鳥取県	直接	鳥取県	—	—	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	布勢総合運動公園における既存公園施設バリアフリー化	鳥取市	■	■	■			490		—	
												小計						490		
												合計							490	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

鳥取県において実施

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

鳥取県ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園利用者（障がい者や高齢者等）の実績は、最終目標値に達せなかったが、公園施設のバリアフリー化は計画どおり実施することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）



引き続き既存公園施設のバリアフリー化の整備を推進し、公園利用者の利便性向上に努めていきたい。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設（園路及び広場、駐車場、便所、運動施設、等）のバリアフリー化	
	最終目標値	60%
	最終実績値	60%
2	公園施設のバリアフリー化により施設利用免除となる公園利用者（障がい者や高齢者等）実績	
	最終目標値	256千人
	最終実績値	153千人
		事業中間年度（H30）は中間目標値を達成したが、事業完了年度（R1）はコロナ等の影響により例年に比べ利用者数が大きく減少したため、最終目標値と差がでたものと推測。

計画の名称	鳥取県共生社会実現に向けた誰もが集える安全・安心な公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成28年度～H30年度 (3年間)	交付対象	鳥取県

【平面図】

0 50 100 200 300 m

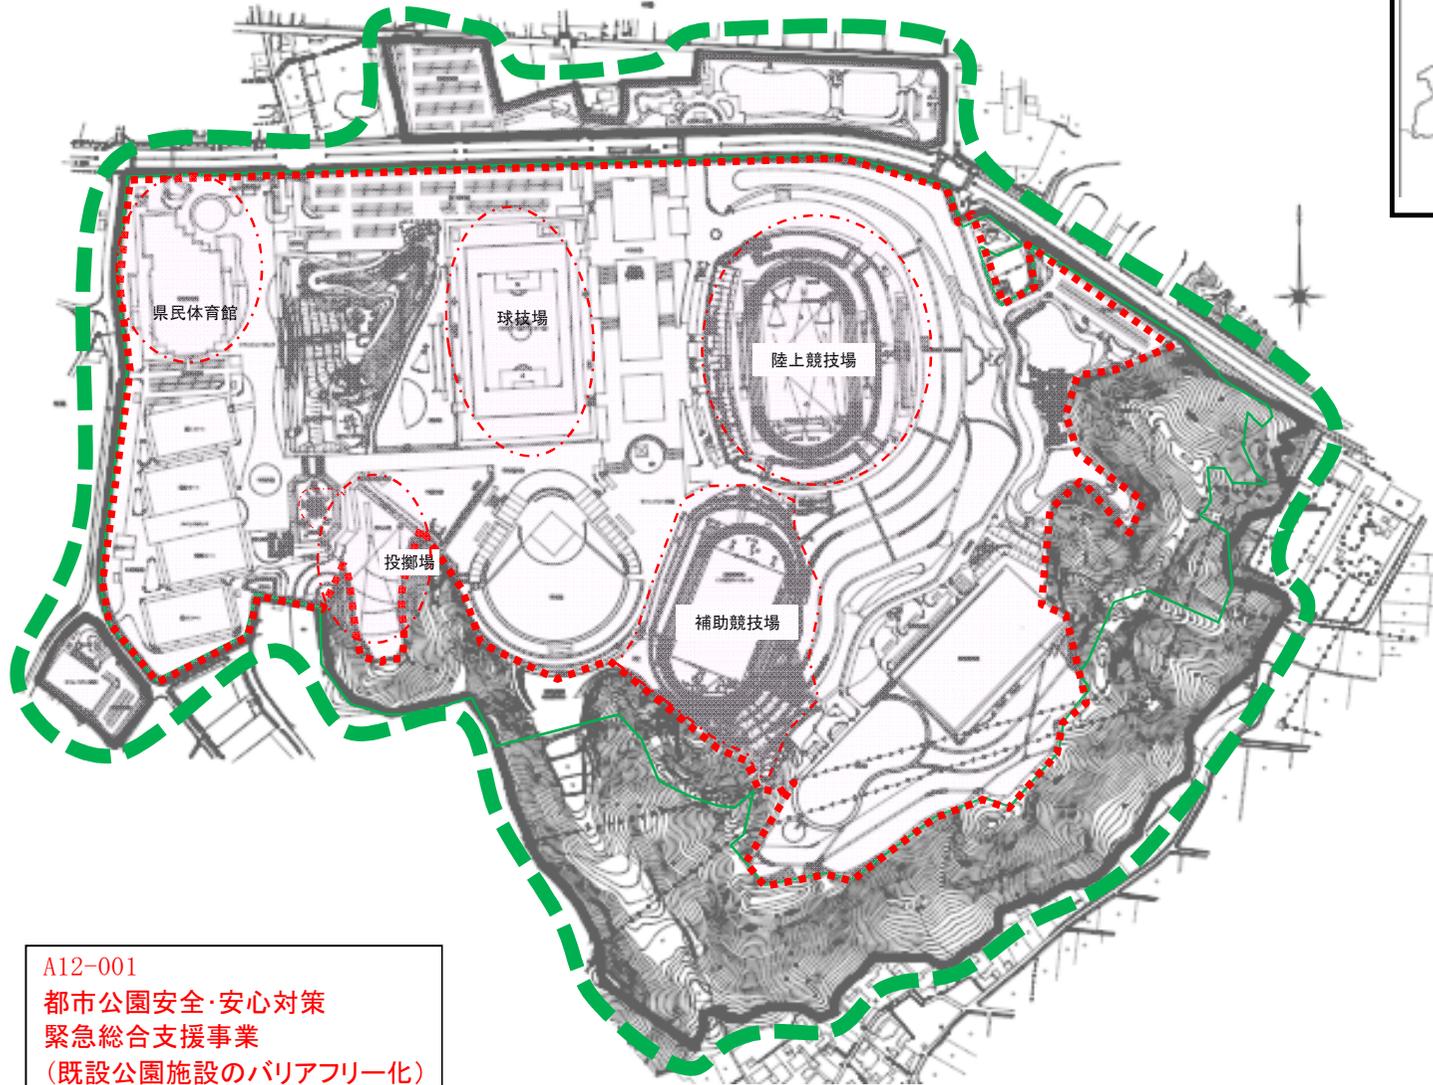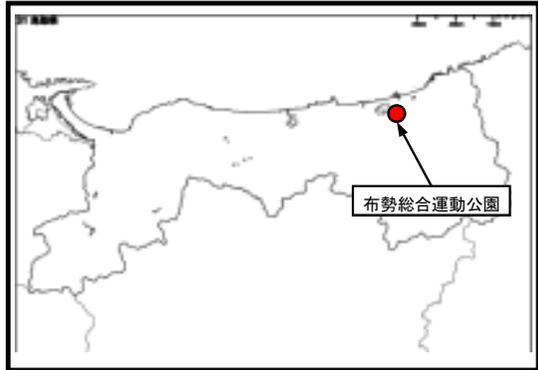

A12-001
 都市公園安全・安心対策
 緊急総合支援事業
 (既設公園施設のバリアフリー化)

 都市公園範囲
 基幹事業
