


5-4-2 サンドバック製の突堤

- ・パイプラインの敷設地点から汀線付近に降りたところにサンドバック（麻袋）を積み重ねた突堤があった。
- ・ここでもコンクリート製のブロックは用いていなかった。
- ・日本では、コンクリート製のブロックを積み重ねて設置した突堤や離岸堤しか見たことがない。

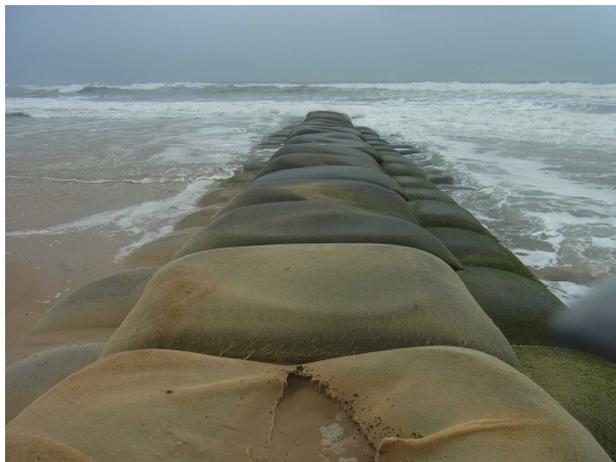

5-5 Mooloolaba Beach (ポンプ浚渫船 & パイプラインによる砂移送) 13日午前(中)

5-5-1 砂排出口付近

- ・砂排出口付近及び利用状況を調査した。



- ・Noosa Main Beach と同様に、海水面→汀線→砂浜→通路→広場→樹木→歩道→車道という景観が素晴らしかった。背後地との連続性・一体感が素晴らしい。
- ・素晴らしさの特徴は、日本の海岸のほとんどで見られるようなコンクリート製の直立護岸が見えないこと（存在しないこと）、パラペット護岸が存在しないこと、車道から海水面を目線の高さで見ることができることなど多くの点がある。
- ・砂浜の地下 2m 程度のところにパイプラインが埋設されている。
- ・途中、ライフセーバーの訓練状況に遭遇した。

