

地域県土警察常任委員会資料

(令和8年4月21日)

- 主要地方道若桜下三河線バイク転倒事故(令和8年(ツ)第6号損害賠償請求上告事件)
に係る上告の棄却(勝訴確定)について

【道路企画課】……………2ページ

- 塩見川水系の特定都市河川指定に向けた取組について

【河川課】……………3ページ

- 中小河川洪水浸水想定区域の指定について

【河川課】……………4ページ

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【技術企画課、道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、港湾課】……………6ページ

県土整備部

主要地方道若桜下三河線バイク転倒事故（令和8年（ツ）第6号損害賠償請求上告事件） に係る上告の棄却（勝訴確定）について

令和8年4月21日
道路企画課

標記裁判について、令和8年3月25日に判決の言い渡しがあり、上告人（個人）の請求が棄却され、県の勝訴が確定した旨の連絡が担当弁護士からありました。

＜上告審判決：大阪高等裁判所＞【勝訴確定】

主文

- 1 本件上告を棄却する。
- 2 上告費用は上告人の負担とする。

1 一審判決の概要（龍野簡易裁判所 令和6年12月9日 過失割合 被告9：原告1）

- (1) 被告（県）は、原告（個人）に対し、54万2,929円及びこれに対する令和4年5月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
- (2) 原告のその余の請求を棄却する。
- (3) 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
- (4) この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

2 控訴審判決の概要（神戸地方裁判所 令和7年10月28日 賠償責任なし）

- (1) 控訴人（県）の控訴に基づき原判決を取り消す。
 - (2) 被控訴人（一審原告：個人）の請求を棄却する。
 - (3) 被控訴人の付帯控訴を棄却する。
 - (4) 控訴費用は1審、2審とも被控訴人の負担とする。
 - ① 転倒の原因となった砂利が本件くぼみ又は本件道路から発生したとするには疑問が残る一方で、通過車両の積載物が落下した可能性も排斥できないことからすれば、控訴人の道路管理に瑕疵があったということはできない。
 - ② 控訴人は本件事故の2日前に道路パトロールを行ったが異常が確認されなかったこと等に加え、控訴人に本件砂利が堆積していることの通報があったとうかがわれないこと、頻回の道路パトロールが必要とされる道路ではないことに照らせば、本件事故前に本件砂利を発見して撤去するなどの回避措置をとることは事実上不可能であって、控訴人に結果回避可能性はなかったことが認められる。
- ⇒ その余の点について判断するまでもなく、被控訴人の請求を一部認容した原判決は相当でなく、控訴人の控訴は理由があるから、原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。（被控訴人の付帯控訴等は棄却）

3 経緯

- R4.05.04 事故発生
- R4.08.05 訴訟提起（龍野簡裁・令和4年（ハ）第65号）
- R6.10.28 弁論終結
- R6.12.09 判決言い渡し（鳥取県の敗訴 過失割合9：1）

- R6.12.25 控訴提起（神戸地裁・令和7年（レ）第6号 控訴人側の9割部分を争うもの）
- R7.05.08 付帯控訴提起（被控訴人側の1割部分を争うもの）
- R7.06.24 裁判所が和解検討メモ提示（過失割合8：2）
→県に事故の予見可能性・回避可能性を認める内容で受入れ余地がないもの。追加で準備書面を提出。
- R7.09.09 弁論終結
- R7.10.28 控訴審判決言渡し（控訴棄却 鳥取県の勝訴 賠償責任なし）

- R7.11.10 上告提起（大阪高裁・令和8年（ツ）第6号）
- R8.03.25 上告審判決言渡し（上告棄却 鳥取県の勝訴確定）

塩見川水系の特定都市河川指定に向けた取組について

令和8年4月21日
河川課

二級河川塩見川水系の浸水対策推進のため、令和6年度から特定都市河川（特定都市河川浸水被害対策法）の指定に向けた地元調整を鳥取市と連携して進めています。

この度、地元調整が整った支川江川流域を対象に地元代表者・県・市で流域水害対策計画検討会を立ち上げ、塩見川本川に先行して令和9年第1四半期の指定を目指し手続きを進めることとしました。

1 特定都市河川指定制度の概要

- 水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川（流域）を指定し、地元住民、行政機関等の関係者による流域水害対策協議会で流域水害対策計画を策定し、浸水防止対策を総合的に推進する。
- 流域内における一定規模(1,000㎡)以上の開発による雨水浸透阻害行為（土地の舗装等）に対し、流出雨量の増加分をカットするための対策工事（浸透ます等の雨水貯留浸透施設）を義務付ける。

2 指定に向けた取組状況

(1) 江川流域の先行指定

- 塩見川流域全体での指定を目指す中で、令和5年7月の江川上流部の浸水被害発生を受け、令和6年度から江川流域の浸水対策の調査・検討を実施しており、本川に先行して地元調整が整ったことから、江川を先行指定することとした。なお、塩見川本川についても、引き続き指定に向けて地元調整を進めていく。

(2) 地元調整状況

- 江川を先行指定することについて、福部町区長会、福部地域振興未来会議、駅前地区河川委員会、江川流域のうち特に浸水の影響を受ける5集落の総会で説明し、概ね理解が得られた。
- 江川流域全8集落（469世帯）を対象にアンケート調査を実施したところ、先行指定に前向きな回答が6割を超える結果となった。一方で開発への影響を懸念する意見が3件あったことから、制度の周知等に努めていく。


(3) 江川流域における流域水害対策計画検討会の設置

- 指定後の流域水害対策計画の早期策定及び浸水対策の円滑実施を目的として、指定に先立ち地元代表者・県・市による「流域水害対策計画検討会」を設置し、令和8年3月23日に第1回検討会を開催した。今後、流域水害対策計画の原案作成を進め令和9年第1四半期の指定を目指す。

3 スケジュール（江川流域）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度以降
流域水害対策計画検討会・協議会	合意形成		検討会	協議会
流域水害対策計画	浸水対策調査検討・原案		素案	案
特定都市河川指定			指定の事前周知 (公示日を周知)	指定の公示

(流域図)

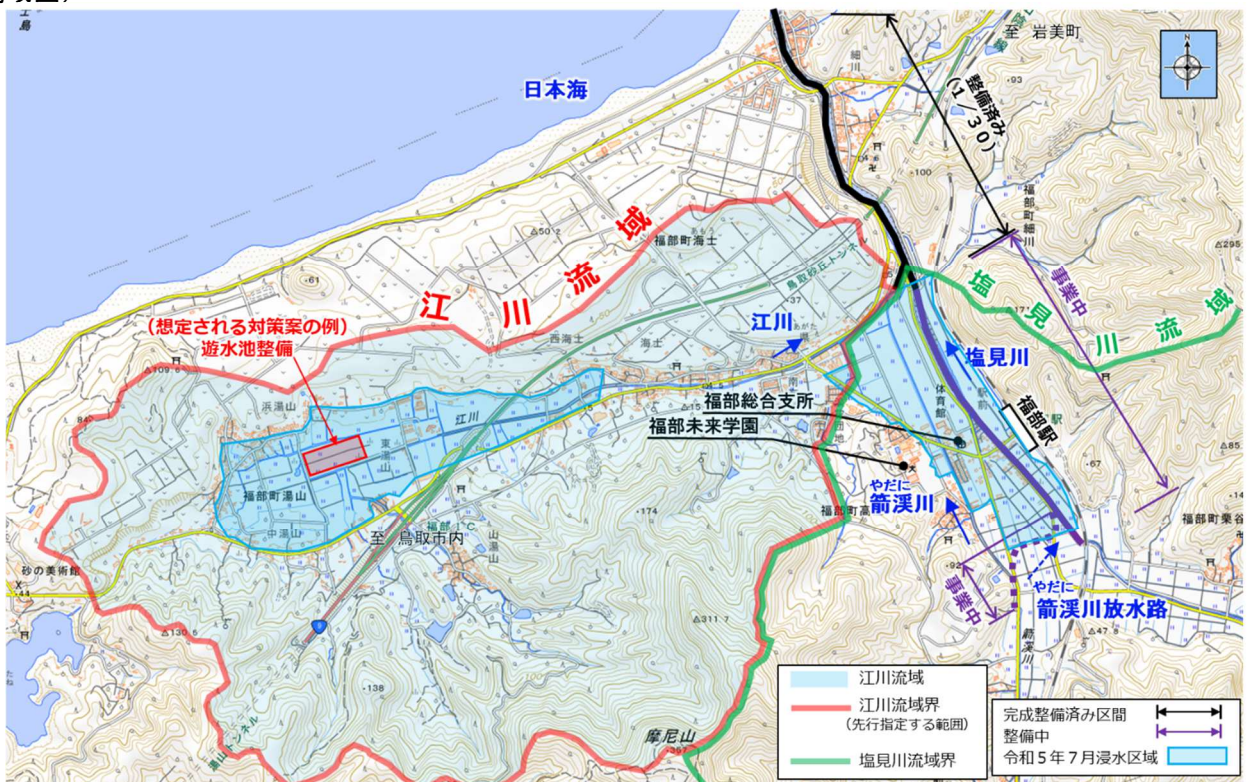

中小河川洪水浸水想定区域の指定について

令和8年4月21日
河川課

鳥取県は、水防法の改正に基づく県管理の中小河川における想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域を令和8年3月31日に指定し、公表しました。

今後、市町村において、洪水ハザードマップの更新や避難所等の見直し等の防災情報の充実や避難体制の強化が行われる予定であり、県は技術的な支援を進めます。

1 概要

- 令和3年の水防法改正により、水害リスク空白域解消のため、従来の洪水予報河川・水位周知河川に加え、その他の中小河川における想定最大規模降雨（年超過確率約1/1000）の洪水浸水想定区域の指定が義務付けられた。
- 令和8年3月31日に、県管理河川（294河川）のうち沿川に人家等の防御対象がある279河川について、水防法第14条の規定に基づく洪水浸水想定区域の指定、告示を行った。
- これを受けて、市町村において、今回指定した洪水浸水想定区域をもとに、水防法第15条の規定に基づく洪水ハザードマップの更新や避難所等の見直しが行われる予定である。

2 水防法改正と洪水浸水想定区域指定の経緯

年度	内容	対象河川	対象洪水	浸水想定区域指定
平成13年	浸水想定区域の指定を新設	洪水予報河川(1)	計画規模	平成20年指定
平成17年	指定対象の拡大	洪水予報河川(1), 水位周知河川(18)	計画規模	平成19～22年指定
平成27年	対象洪水の拡大	洪水予報河川(1), 水位周知河川(19)	想定最大規模	平成30年指定
令和3年	指定対象の拡大	洪水予報河川(1), 水位周知河川(19), その他中小河川(279)	想定最大規模	今回指定 (指定済河川の上流部を含む)


3 今回指定した河川

管内	河川数	河川名
鳥取県土整備事務所	81	千代川水系湖山川ほか44河川、陸上川水系陸上川、吉田川水系吉田川、蒲生川水系蒲生川ほか6河川、塩見川水系塩見川ほか4河川、溝川水系溝川ほか2河川、内海川水系新内海川、河内川水系河内川ほか5河川、浜村川水系浜村川ほか3河川、永江川水系永江川、勝部川水系勝部川ほか6河川
八頭県土整備事務所	30	千代川水系八東川ほか29河川
鳥取・八頭県土整備事務所	2	千代川水系千代川ほか1河川
中部県土整備局	80	天神川水系天神川ほか31河川、石脇川水系石脇川、園川水系園川、原川水系原川、宇谷川水系宇谷川、橋津川水系橋津川ほか8河川、由良川水系由良川ほか14河川、加勢蛇川水系加勢蛇川、御幸川水系御幸川、馬込川水系馬込川、洗川水系洗川ほか2河川、茅町川水系茅町川、元旧川水系元旧川、八橋川水系八橋川ほか3河川、本谷川水系本谷川、化粧川水系化粧川、月の輪川水系月の輪川、勝田川水系勝田川ほか1河川、黒川水系黒川ほか2河川
米子県土整備局	50	日野川水系勝寺川ほか18河川、斐伊川水系橋本川ほか4河川、甲川水系甲川ほか1河川、下市川水系下市川ほか1河川、宮川水系宮川、真子川水系真子川ほか1河川、名和川水系名和川2河川、阿弥陀川水系阿弥陀川ほか2河川、江東川水系江東川ほか1河川、谷川水系谷川、妻木川水系妻木川、宇田川水系宇田川ほか2河川、塩川水系塩川、佐陀川水系佐陀川ほか2河川、大水落川水系大水落川、加茂新川水系加茂新川
日野県土整備局	35	日野川水系小江尾川ほか34河川
米子・日野県土整備局	1	日野川水系日野川
合計	279	

4 指定に伴い義務づけられる事項

- 水防法（第15条の3）関係
 - 要配慮者利用施設（社会福祉施設、病院等）における避難確保計画の策定と避難訓練の実施
- 宅地建物取引業法（第35条）関係
 - 不動産取引の重要事項説明の対象項目に洪水ハザードマップにおける所在地を追加
- 都市計画法（第34条）関係
 - 市街化調整区域内（関係市町村：鳥取市、米子市、日吉津村）の開発行為における防災対策措置等（浸水面以上となる居室を設ける等）

5 今回指定の事例（鳥取市気高町：河内川、浜村川ほか）

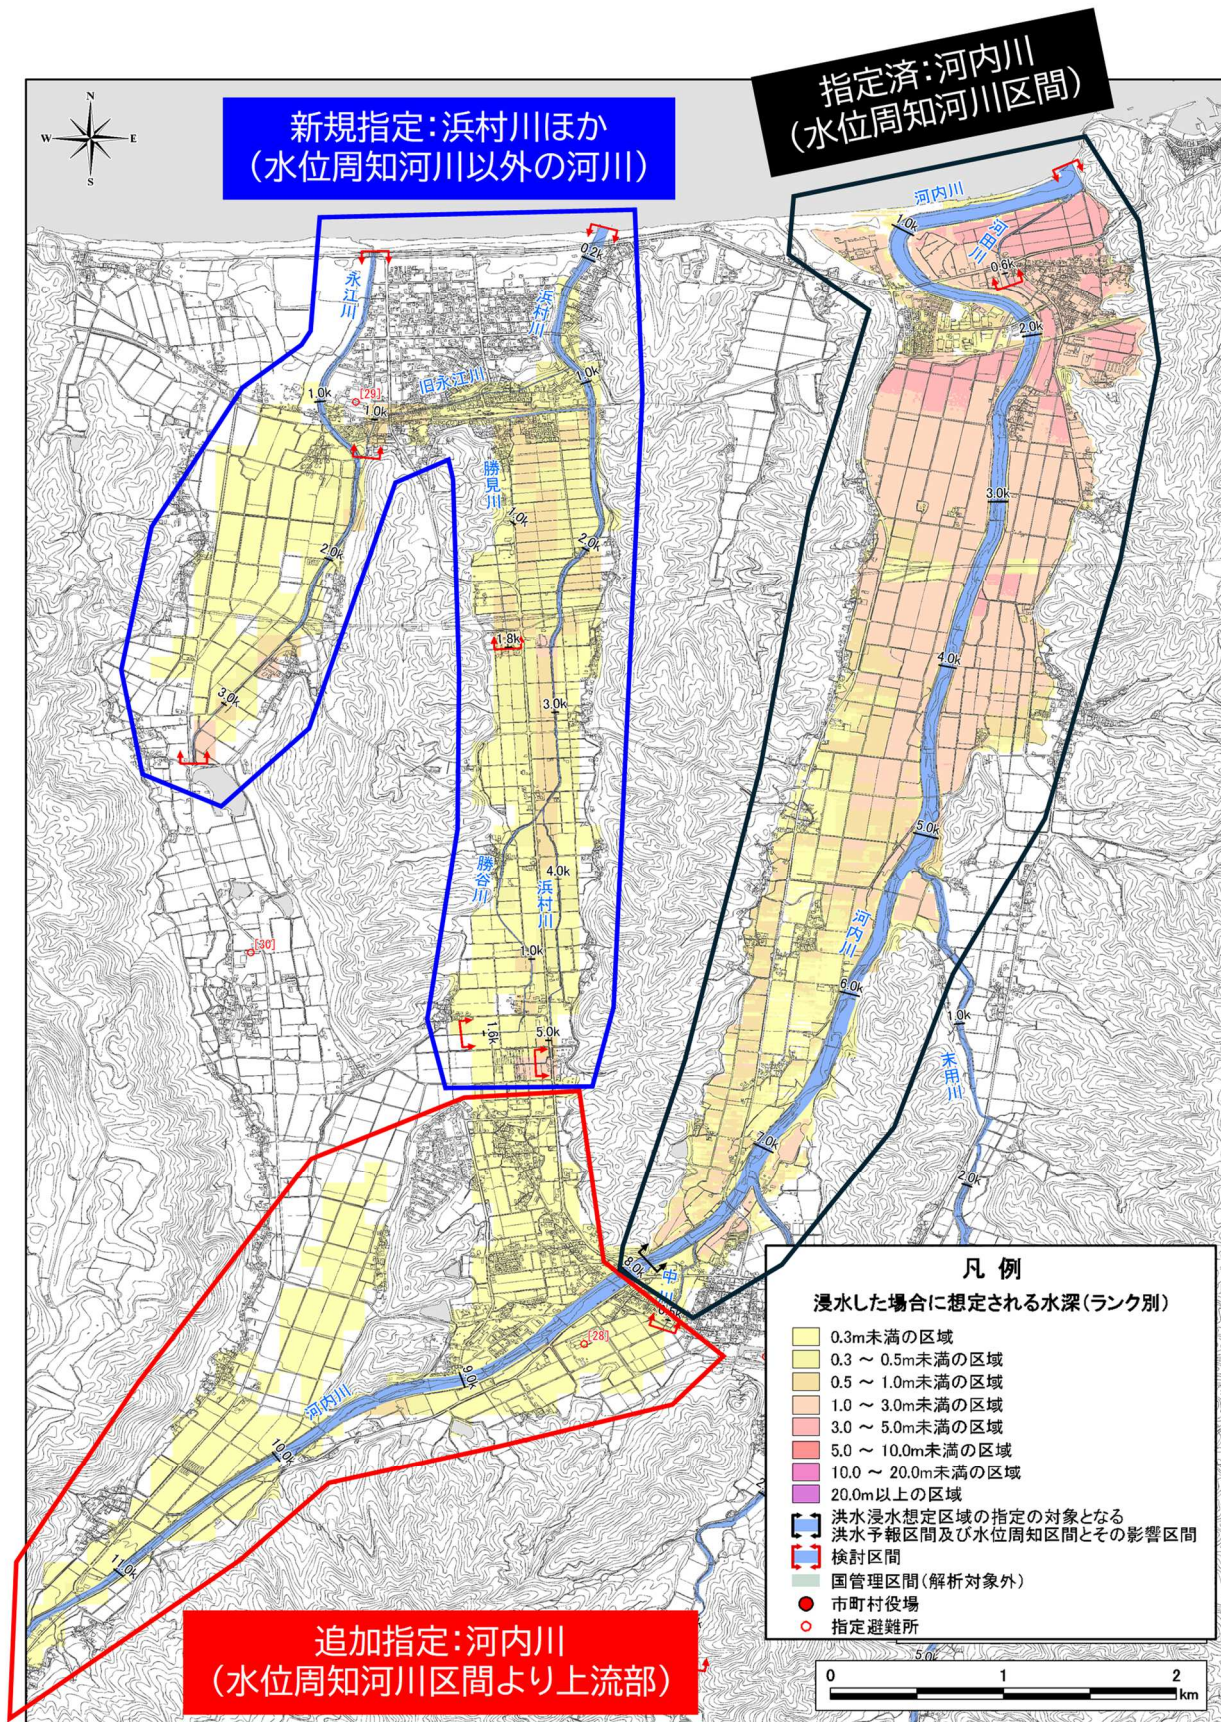

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】		県土整備部					
主 務 課	工 事 名	工 事 場 所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	入 札 方 式
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(北条倉吉道 路延伸)舗装工事(補助改 良)(国補正)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	195,470,000円 (予定価格) 199,542,200円	令和8年3月30日 ～ 令和8年12月18日	令和8年3月30日	制限付 一般競争入札 (3社)
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	県道鳥取鹿野倉吉線(坂 本工区)改良工事(3工 区)(交付金)	東伯郡 三朝町 坂本	株式会社クラエー 代表取締役 西村 博文	99,770,000円 (予定価格) 108,297,200円	令和8年3月23日 ～ 令和8年12月7日	令和8年3月23日	制限付 一般競争入札 (6社)
河川課 (鳥取県土 整備事務所)	塩見川広域河川改修工 事(16工区)(国補正)	鳥取市 福部町 細川	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	171,050,000円 (予定価格) 183,889,200円	令和8年3月9日 ～ 令和8年11月30日	令和8年3月9日	制限付 一般競争入札 (22社)
河川課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	水貫川河川改修工事(9 工区)(補助)(国補正)	米子市 皆生新田	イワタ建設株式会社 代表取締役 岩田 義美	109,219,000円 (予定価格) 109,224,500円	令和8年3月11日 ～ 令和8年11月25日	令和8年3月10日	制限付 一般競争入札 (1社)
治山砂防課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	佐陀川砂防堰堤(K1)工 事(9工区)(補助)(国補 正)	西伯郡 伯耆町 丸山	株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	129,250,000円 (予定価格) 137,655,100円	令和8年3月5日 ～ 令和8年12月25日	令和8年3月4日	制限付 一般競争入札 (1社)
治山砂防課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	日の詰川砂防堰堤工事 (堰堤工)及び山ノ神谷川 砂防堰堤工事(工事用道 路)(国補正)	日野郡 日野町 俣野外	株式会社コーセー 代表取締役 川端 登志一	97,460,000円 (予定価格) 105,987,200円	令和8年3月19日 ～ 令和8年12月8日	令和8年3月19日	制限付 一般競争入札 (6社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
治山砂防課 〔西部総合事務所 日野県土整備局〕	根雨地区急傾斜地崩壊 対策工事(国補正)	日野郡 日野町 根雨	有限会社浜本組 代表取締役 浜本 伸介	95,920,000円 (予定価格) 104,608,900円	令和8年3月17日 ～ 令和8年12月2日	令和8年3月17日	制限付 一般競争入札 (7社)
港湾課 〔鳥取港湾事務所〕	田後港第7防波堤補修外 工事(交付金)	岩美郡 岩美町 田後	株式会社伊藤組鳥取営業所 鳥取営業所所長 中野 浩二	132,550,000円 (予定価格) 143,671,000円	令和8年3月27日 ～ 令和8年11月24日	令和8年3月27日	制限付 一般競争入札 (2社)
港湾課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	石脇港海岸離岸堤修繕 工事(6工区)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 泊	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	116,600,000円 (予定価格) 119,438,000円	令和8年4月13日 ～ 令和8年12月4日	令和8年3月13日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】 主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 鳥取県土 整備事務所	佐治川河川災害復旧工 事(R5年災148号)	鳥取市 佐治町 古市	有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄	(当初契約額) 174,350,000円	令和6年9月10日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月10日	-
					(変更後工期) 令和6年11月28日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	資材の確保に時間を要 したことによる工期の延 伸
				(第2回変更後契約額) 198,936,100円 (変更額) 〔 24,586,100円 〕	(変更後工期) 令和8年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和7年11月26日	関連する農地災害復旧 工事との調整に不測の 日数を要したことによる 工期の延伸及び残土搬 出箇所の変更を行ったこ とによる工事費の増
	(第3回変更後契約額) 204,892,600円 (変更額) 〔 5,956,500円 〕	(変更後工期) 令和8年7月31日	(第3回変更契約年月日) 令和8年3月12日	支障木伐採等を追加し たことによる工事費の増 及び隣接工事や残土搬 出先との調整による工期 の延伸			

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔 鳥取県土 整備事務所〕	春谷川砂防災害復旧工 事(R5年災335号、336号 及び337号)	鳥取市 佐治町 春谷	北村屋木材株式会社 代表取締役 有田 繁博	(当初契約額) 143,990,000円	令和6年9月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月9日	-
					(変更後工期) 令和7年6月10日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月11日	資材の確保に時間を要 したことから工期の延 伸
					(変更後工期) 令和7年12月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年6月9日	地元調整の結果、農繁 期を避けた施工を行うこ ととなったことによる工期 の延伸
				(第3回変更後契約額) 143,053,900円 〔 (変更額) △936,100円〕	(変更後工期) 令和8年3月16日	(第3回変更契約年月日) 令和7年12月22日	支持地盤が高く出た為、 ブロック積の面積が減つ たことによる工事費の減 及び関連工事との工程 調整による工期の延伸
					(変更後工期) 令和8年6月10日	(第4回変更契約年月日) 令和8年3月13日	顕著な大雪の影響を受 け、現地作業に遅れが 生じ、関係工事などと工 程の再調整を行ったこと による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 鳥取県土 整備事務所	大石川砂防災復旧工 事(R5年災326号(7~8 工区))	鳥取市 国府町 大石	福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平	(当初契約額) 171,160,000円 (第1回変更後契約額) 226,997,100円 (変更額) 55,837,100円	令和7年3月3日 ~ 令和8年1月5日 (変更後工期) 令和8年3月23日	(当初契約年月日) 令和7年3月3日 (第1回変更契約年月日) 令和7年11月26日	- ・労務単価の特例措置、 ICT施工の実施、残土搬 出箇所の変更を行ったこ とによる工事費の増 ・河道内の転石破碎及び 現場外搬出に不測の日 数を要したことによる工 期の延伸
技術企画課 鳥取県土 整備事務所	国道482号道路災害復旧 工事(R5年災370号)(そ の2)	鳥取市 用瀬 別府	株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文	(当初契約額) 183,040,000円 (第2回変更後契約額) 195,695,500円 (変更額) 12,655,500円	令和7年3月17日 ~ 令和7年12月11日 (変更後工期) 令和8年3月19日	(当初契約年月日) 令和7年1月8日 (第1回変更契約年月日) 令和7年11月11日	- 降雪による転石破碎の 作業効率低下及び建設 残土の処分場への搬出 遅延による工期の延伸 関連する下水工事との 工程調整により、工事の 一部において施工時期 の見直しが必要になった ことによる工期の延伸 他工区との調整の結果、 本工事の影響を受ける ため施工できない区間に ついて、本工事を実施す ることとしたことによる工 事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】 主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 鳥取県土 整備事務所	佐治川河川外災害復旧 工事(R5年災133号、134 号、138号及び380号)	鳥取市 佐治町 加茂外	株式会社トラスト 代表取締役 倉持 崇広	(当初契約額) 110,770,000円 (第1回変更後契約額) 131,003,400円 (変更額) 〔 20,233,400円 〕	令和6年9月27日 ～ 令和7年3月14日 (変更後工期) 令和7年7月31日 (変更後工期) 令和7年10月31日 (変更後工期) 令和8年1月30日 (変更後工期) 令和8年2月27日 (変更後工期) 令和8年3月20日	(当初契約年月日) 令和6年9月27日 (第1回変更契約年月日) 令和7年3月12日 (第2回変更契約年月日) 令和7年7月23日 (第3回変更契約年月日) 令和7年10月28日 (第4回変更契約年月日) 令和8年1月20日 (第5回変更契約年月日) 令和8年2月26日 (第6回変更契約年月日) 令和8年3月18日	- 不落となった道路災害箇 所を早期復旧するため、 本工事に追加したことよ る工事費の増及び工 期の延伸 関連工事との工程調整 等による工期の延伸 土砂の有効利用を図る ため関連工事との工程 調整を行ったことによる 工期の延伸 市の関連工事との工程 調整による工期の延伸 大雪に伴い借地部の地 権者への返還が遅延し たことによる工期の延伸 工費用道路計画の昂直 し及び残土処分先の変 更による工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】 主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕	神馬川外砂防災害復旧 工事(R5年災64号、65 号、296号、297号及び 298号)	鳥取市 河原町 神馬外	株式会社懸樋工務店 代表取締役 懸樋 義樹	(当初契約額) 122,650,000円	令和6年7月29日 ～ 令和7年10月31日 (変更後工期) 令和7年10月31日	(当初契約年月日) 令和6年7月29日 (第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	-
				(第2回変更後契約額) 139,386,500円 〔(変更額) 16,736,500円〕	(変更後工期) 令和8年2月28日	(第2回変更契約年月日) 令和7年10月17日	現地着手後、想定してい た地山土質の変更に伴 い、計画を変更する必要 が生じたことによる工期 の延伸
				(第4回変更後契約額) 147,325,200円 〔(変更額) 7,938,700円〕	(変更後工期) 令和8年3月23日	(第3回変更契約年月日) 令和8年2月27日 (第4回変更契約年月日) 令和8年3月19日	復旧範囲の隣接箇所に 変状が確認され、その修 繕を追加したことによる 工事費の増及び関連事 業との工程調整による工 期の延伸 大雪により、農地復旧作 業の工程が遅延したこと による工期の延伸
							現場条件により、水替工 を作業時排水から常時 排水に変更したこと、隣 接する単災23号を追加 施工したことによる工事 費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	神馬川砂防災害復旧工事(R5年災322号及び323号)	鳥取市 河原町 神馬	株式会社トラスト 代表取締役 倉持 崇広	(当初契約額) 142,297,100円	令和6年8月9日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年8月9日	-
				(第2回変更後契約額) 158,999,500円 〔(変更額) 16,702,400円〕	(変更後工期) 令和8年3月16日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	地元調整の結果、工事用道路の計画を変更する必要が生じたことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 159,152,400円 〔(変更額) 152,900円〕	(変更後工期) 令和8年5月29日	(第3回変更契約年月日) 令和8年3月13日	工事用道路の計画変更等による増額 ・現地精査により、プロットク積の復旧面積が増えたことによる工事費の増 ・植石工の石材調達に不測の日数を要したことによる工期の延伸
技術企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川外河川外災害復旧工事(R5年災127号、131号、157号、331号、332号及び333号)	鳥取市 佐治町 葛谷外	未来建設株式会社 代表取締役 高垣 紀宏	(当初契約額) 110,000,000円	令和7年3月10日 ～ 令和7年11月10日	(当初契約年月日) 令和7年3月10日	-
				(変更後工期) 令和8年1月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年8月27日	関連工事との工程調整による工期の延伸	
				(変更後工期) 令和8年3月16日	(第2回変更契約年月日) 令和8年1月14日	隣接する市の関連工事との工程調整による工期の延伸	
				(変更後工期) 令和8年6月1日	(第3回変更契約年月日) 令和8年3月16日		顕著な大雪の影響を受け、現地着手できなかったことなどによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道鳥取河原線(倭文2工区)改良工事(5工区)(補助)(国補正)	鳥取市 倭文	株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和夫	(当初契約額) 86,680,000円 (第1回変更後契約額) 105,838,700円 〔(変更額) 19,158,700円〕	令和7年7月18日 ～ 令和8年3月16日 (変更後工期) 令和8年3月23日	(当初契約年月日) 令和7年7月18日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月13日	- ・使用資材の変更及び交通誘導員の配置を見直したことによる工事費の増 ・支障物件移転との工期調整による工期の延伸
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	町道勦上野線(岩船大橋)外耐震補強工事	東伯郡 琴浦町 八橋外	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	(当初契約額) 122,980,000円 (第1回変更後契約額) 123,762,100円 〔(変更額) 782,100円〕 (第2回変更後契約額) 135,638,800円 〔(変更額) 11,876,700円〕 (第3回変更後契約額) 128,949,700円 〔(変更額) △6,689,100円〕	令和7年2月26日 ～ 令和7年11月17日 (変更後工期) 令和8年3月24日	(当初契約年月日) 令和7年2月26日 (第1回変更契約年月日) 令和7年3月17日 (第2回変更契約年月日) 令和7年11月12日 (第3回変更契約年月日) 令和8年3月9日	- 岩船大橋工区の工事用道路等は流用土を見込んでいたが、流用元の土質が悪く流用元を変更する必要があることから運搬距離が伸びたことによる工事費の増 岩船大橋において、関係機関との調整により早期の工事用道路撤去を実施するため、本工事に追加したこと等による工事費の増及び工期の延伸 蔵城橋において、工事用道路等の撤去を隣接工事対応にしたことによる工事費の減

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(13工区)(補助)(国補正)	東伯郡 北栄町 江北	エスエー塗装工業株式会社 代表取締役 阪本 阿羅志	(当初契約額) 138,820,000円	令和7年3月31日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年3月31日	-
				(第1回変更後契約額) 152,909,900円 (変更額) 〔14,089,900円〕			
道路企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道羽合東伯線外道路維持工事(北栄工区)(維持修繕)	東伯郡 北栄町 由良宿外	オグラ建設株式会社 代表取締役 小原 知章	(当初契約額) 49,830,000円	令和7年4月4日 ～ 令和8年3月25日	(当初契約年月日) 令和7年4月4日	-
				(第1回変更後契約額) 104,768,400円 (変更額) 〔54,938,400円〕			

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道倉吉江府溝口線(二ノ沢)改良工事(4工区) (防災安全交付金)(ゼロ 県債)	日野郡 江府町 吉原	有限会社住田組 代表取締役 住田 孝昭	(当初契約額) 106,150,000円 (第1回変更後契約額) 114,801,500円 (変更額) 〔 8,651,500円 〕	令和7年3月14日 ～ 令和7年11月28日 (変更後工期) 令和8年8月31日	(当初契約年月日) 令和7年3月13日 (第1回変更契約年月日) 令和7年11月26日	- ・既設コンクリート構造物について、取壊し量を変更したこと等による工事費の増 ・工事の資機材ルート上にある橋が通行不可となったこと等による工期の延伸
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道岩屋谷米子線(新青木橋)橋梁塗装工事(6工区)(補助)	米子市 青木	有限会社小倉興産 代表取締役 小倉 将利	(第2回変更後契約額) 121,217,800円 (変更額) 〔 6,416,300円 〕 (当初契約額) 97,680,000円 (第1回変更後契約額) 102,599,200円 (変更額) 〔 4,919,200円 〕	令和7年9月24日 ～ 令和8年3月16日 (変更後工期) 令和8年5月29日	(当初契約年月日) 令和7年9月22日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	右岸側旧道部の植樹に伴う客土の入れ替え等による工事費の増 ・環境対策資機材等の数量を見直したこと等による工事費の増 ・河川法24条、26条の許可に日数を要したこと等による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (西部総合事務所 〔米子県土整備局〕)	県道岩屋谷米子線(新青木橋)橋梁塗装工事(7工区)(補助)	米子市 青木	しんあおきはし特定建設(みたこ土建・原明建設)工事共同企業体 代表者 株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 100,100,000円	令和7年9月26日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年9月25日	-
				(第1回変更後契約額) 111,728,100円 〔 (11,628,100円) 〕	(変更後工期) 令和8年5月29日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	・環境対策資機材等の数量を見直したこと等による工事費の増 ・河川法24条、26条の許可に日数を要したこと等による工期の延伸
道路建設課 (八頭県土 〔整備事務所〕)	県道麻生国府線(福地区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正)	八頭郡 八頭町 福地	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 92,840,000円	令和7年3月24日 ～ 令和7年12月3日	(当初契約年月日) 令和7年3月24日	-
				(第2回変更後契約額) 107,486,500円 〔 (14,646,500円) 〕	(変更後工期) 令和8年3月9日	(第2回変更契約年月日) 令和7年11月28日	・仮橋杭基礎において地質状況に応じ施工方法を変更したことによる工事費の増 ・上記の施工方法変更に伴う工程見直し等による工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 114,710,200円 〔 (7,223,700円) 〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年3月9日	ICT活用工事による機械経費の増額等による工事費の増
						(第1回変更契約年月日) 令和7年3月25日	年度別支出金額の変更

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 八頭県土 整備事務所	県道津山智頭八東線(大 呂2工区)改良工事(護 岸9工区)(交付金改良)	八頭郡 智頭町 大呂	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 95,700,000円	令和7年9月5日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年9月5日	-
				(変更後工期) 令和7年7月30日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月11日	施工上支障となる電柱 及び架線の移設に日数 を要したこと等による工 期の延伸	
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	県道倉吉東伯線(津原工 区)改良工事(8工区)(交 付金改良)(国補正)	倉吉市 津原	加登脇建設株式会社 代表取締役 加登脇 孝彦	(当初契約額) 84,150,000円	令和7年4月1日 ～ 令和7年12月1日	(当初契約年月日) 令和7年3月14日	-
				(第1回変更後契約額) 96,890,200円 (変更額) 〔12,740,200円〕	(変更後工期) 令和8年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和7年11月25日	・流用土の土質改良を追 加したことによる工事費 の増 ・土質改良の検討及び実 施に日数を要したこと による工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイ パス)改良工事(11工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 田後 ～ はわい長瀬	株式会社へいせい 代表取締役 種子 善之	(第2回変更後契約額) 107,552,500円 (変更額) 〔10,662,300円〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年3月5日	ICT活用工事による機械 経費の増額等による工 事費の増
				(当初契約額) 178,530,000円	令和7年7月1日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年7月1日	-
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイ パス)改良工事(11工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 田後 ～ はわい長瀬	株式会社へいせい 代表取締役 種子 善之	(第1回変更後契約額) 188,929,400円 (変更額) 〔10,399,400円〕	(変更後工期) 令和8年8月31日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月9日	・側道の施工を追加した ことによる工事費の増 ・上記施工を追加したこ とによる工期の延伸
				(当初契約額) 107,552,500円 (変更額) 〔10,662,300円〕			

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(8工区) (補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 田後	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	(当初契約額) 121,000,000円	令和7年4月15日 ～ 令和8年1月15日	(当初契約年月日) 令和7年3月24日	-
				(変更後契約額) 176,113,300円 (変更額) 〔55,113,300円〕	(変更後工期) 令和8年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月13日	軟弱地盤対策工法の検討及び基礎の変更に伴う工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 176,113,300円 (変更額) 〔55,113,300円〕	(変更後工期) 令和8年6月15日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月24日	・ボックスカルバートの施工を追加したことによる工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	街路上井羽台線改良工事(15工区)(交付金改良)	倉吉市 上井	福井土建株式会社 代表取締役 福井 重秋	(当初契約額) 118,800,000円	令和6年12月10日 ～ 令和7年9月2日	(当初契約年月日) 令和6年12月10日	-
				(第1回変更後契約額) 143,209,000円 (変更額) 〔24,409,000円〕	(変更後工期) 令和8年3月2日	(第1回変更契約年月日) 令和7年7月3日	・本工事に隣接する14工区工事(落石対策)との工程調整の結果による工期の延伸 ・防護柵設置工事を追加したこと等に伴う工事費の増
				(第2回変更後契約額) 158,763,000円 (変更額) 〔15,554,000円〕	(変更後工期) 令和8年3月19日	(第2回変更契約年月日) 令和8年2月27日	JR近接箇所の工事において、鉄道監視員の確保が難航したことによる工期の延伸
(第3回変更後契約額) 158,763,000円 (変更額) 〔15,554,000円〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年3月17日	JR協議及び現道交通への影響を考慮し、鉄道監視員及び交通誘導員の人員を増やしたこと等による工事費の増				

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイパス)改良工事(3工区) (補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社共栄組 代表取締役社長 山崎 浩貴	(当初契約額) 180,730,000円	令和7年2月17日 ～ 令和7年12月18日	(当初契約年月日) 令和7年2月17日	-
				(第2回変更後契約額) 179,163,600円 (変更額) 〔△1,566,400円〕	(変更後工期) 令和8年3月23日	(第1回変更契約年月日) 令和7年11月7日	土地改良区との用水確保の調整に伴う工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイパス)改良工事(7工区) (補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社高野組 代表取締役 高力 久美	(当初契約額) 171,600,000円	令和7年3月31日 ～ 令和8年1月28日	(当初契約年月日) 令和7年3月31日	-
				(第2回変更後契約額) 235,502,300円 (変更額) 〔63,902,300円〕	(変更後工期) 令和8年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月6日	路体盛土に使用する流用土の受け入れ調整に日数を要したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 235,502,300円 (変更額) 〔63,902,300円〕	(変更後工期) 令和8年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月19日	・盛土に使用する現場発生土の土質改良を追加したことによる工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイパス)改良工事(9工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社晃進 代表取締役 中口 雄志郎	(当初契約額) 144,540,000円	令和7年6月24日 ～ 令和8年3月13日 (変更に後工期) 令和8年6月26日	(当初契約年月日) 令和7年6月24日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	- 隣接工区との工程調整の結果による工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(北条倉吉道路延伸)改良工事(4工区) (補助改良)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 152,130,000円 (第1回変更後契約額) 185,130,000円 (変更額) 〔 33,000,000円 〕	令和7年10月15日 ～ 令和8年3月13日 (変更に後工期) 令和8年7月31日	(当初契約年月日) 令和7年10月15日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	- ・インターチェンジの整備に関する工事を追加したこと等による工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(北条倉吉道路延伸)橋梁上部工事(本線橋(仮称)) (補助改良)(その2)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社横河ブリッジ大阪支店 支店長 片山 憲一	(当初契約額) 419,100,000円 (第1回変更後契約額) 395,541,300円 (変更額) 〔 △23,558,700円 〕	令和6年11月12日 ～ 令和8年3月13日 (変更に後工期) 令和8年3月25日	(当初契約年月日) 令和6年11月11日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月3日	・他工事との調整の結果、本工事の床版製作量を減じたことによる工事費の減 ・町道の通行規制に係る関係機関との調整に日数を要したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道大滝白水線(大坂工 区)改良工事(9工区) (防災安全交付金)	西伯郡 伯耆町 大滝	株式会社所子建設 代表取締役 中川 郁夫	(当初契約額) 99,000,000円	令和7年8月29日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年8月28日	-
					(変更後工期) 令和8年6月22日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	通行規制にかかる地元 調整の結果による工期 の延伸
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	国道181号(佐川～根雨 原工区)護岸工事(2工 区)(防災安全交付金)	西伯郡 伯耆町 根雨原	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 196,966,000円	令和7年10月31日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年10月30日	-
				(第1回変更後契約額) 183,480,000円 (変更額) △13,486,000円	(変更後工期) 令和8年9月30日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月5日	・ブロック張の構造を変 更したことによる工事費 の減 ・ブロック張の構造検討 に日数を要したことによ る工期の延伸
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道西伯根雨線(中工 区)改良工事(4工区) (防災安全交付金)	西伯郡 南部町 中	有限会社藤本組 代表取締役 野川 啓一	(当初契約額) 121,000,000円	令和7年10月8日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年10月7日	-
					(変更後工期) 令和8年7月31日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月11日	土質の変化(硬岩)によ り施工効率が低下したこ とによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 〔米子県土整備局〕)	街路両三柳中央線改良 工事(18工区)(補助)(国 補正)	米子市 両三柳	株式会社みたご土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 180,400,000円 (第1回変更後契約額) 184,903,400円 (変更額) 〔 4,503,400円 〕	令和7年3月10日 ～ 令和8年1月9日 (変更後工期) 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年3月7日 (第1回変更契約年月日) 令和7年12月18日	- ・側溝工について、設置 箇所を見直したこと等に よる工事費の増 ・地下埋設物管理者との 調整に時間を要したこと による工期の延伸
道路建設課 (西部総合事務所 〔日野県土整備局〕)	国道180号(福長～菅沢 工区)橋梁上部工事(1 号橋)(交付金改良)	日野郡 日野町 福長	株式会社駒井ハルテック中国 事業所 所長 五十嵐 賢	(第2回変更後契約額) 189,784,100円 (変更額) 〔 4,880,700円 〕 (当初契約額) 253,770,000円 (第1回変更後契約額) 266,495,900円 (変更額) 〔 12,725,900円 〕	(変更後工期) 令和8年5月15日 (当初契約年月日) 令和6年11月25日 (変更後工期) 令和8年3月16日 (変更後工期) 令和8年4月15日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月12日 (当初契約年月日) 令和6年11月25日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月10日	・ICT活用工事として、 LightICTを実施したこと 等による工事費の増 ・仮設信号機等の設置に ついて、警察との調整に 時間を要したことによる 工期の延伸 - ・工費用道路及び施工 ヤードに敷鉄板を敷設し たこと等による工事費の 増 ・1月から2月にかけての 寒波の影響により現場 塗装工の工程を見直し たことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】 主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課	鳥取県中小河川浸水想定区域図作成及び洪水予測システム構築業務委託	鳥取県 全域	三井共同建設コンサルタント株式会社 山陰営業所	(当初契約額) 78,760,000円 (第1回変更後契約額) 93,228,300円 (変更額) 〔 14,468,300円 〕	令和7年1月30日 ～ 令和7年12月26日 (変更後工期) 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年1月30日 (第1回変更契約年月日) 令和7年12月4日	- ・洪水浸水想定区域図の表示内容を見直す作業を追加したこと等による委託料の増 ・上記作業に伴う工期の延伸
河川課 〔 鳥取県土整備事務所 〕	日置川河川改修工事(13工区)	鳥取市 青谷町 青谷	YAHATA株式会社 代表取締役 中山 忠雄	(当初契約額) 114,730,000円 (第1回変更後契約額) 164,168,400円 (変更額) 〔 49,438,400円 〕	(変更後工期) 令和8年3月27日 令和7年7月24日 ～ 令和8年3月16日	(第2回変更契約年月日) 令和8年2月5日 (第3回変更契約年月日) 令和8年3月10日	洪水予測システムの表示項目を追加したことによる委託料の増 公表内容についての関係機関との調整に時間を要したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 鳥取県土 整備事務所	佐治川ダム堰堤改良工 事(洪水放流設備改良) (1期工事)	鳥取市 佐治町 尾際	株式会社大和エンジニアリン グ 代表取締役 後藤 浩美	(当初契約額) 175,560,000円 (第1回変更後契約額) 194,086,200円 (変更額) 〔 18,526,200円 〕	令和6年10月2日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和6年10月2日 (第1回変更契約年月日) 令和7年7月28日	- 現地調査の結果、ハン ガービームの致金物等 の老朽化が確認された ことから、更新作業を追 加したことによる工事費 の増
河川課 八頭県土 整備事務所	私都川(延命寺工区)河 川災害関連工事(6工区)	八頭郡 八頭町 別府	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 119,900,000円 (第1回変更後契約額) 193,871,700円 (変更額) 〔 △214,500円 〕	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月16日 (変更後工期) 令和8年10月31日 (変更額) 〔 18,477,800円 〕	(当初契約年月日) 令和7年10月9日 (第2回変更契約年月日) 令和8年3月6日	- ゲートの開閉装置につい て、現地精査の結果、安 価な塗装仕様に変更し たことによる工事費の減
河川課 八頭県土 整備事務所	私都川(延命寺工区)河 川災害関連工事(7工区)	八頭郡 八頭町 大坪 ～ 延命寺	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 99,880,000円 (第1回変更後契約額) 109,005,600円 (変更額) 〔 9,125,600円 〕	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月16日 (変更後工期) 令和8年10月30日 (変更額) 〔 9,125,600円 〕	(当初契約年月日) 令和7年10月9日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月16日	- ・不足土流用元の変更に 伴い運搬距離が延びた ことによる工事費の増 ・近接する他工区との工 程調整による工期の延 伸 ・工費用道路の仮設方 法の見直しによる工事費 の増 ・地元関係者との調整に よる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 八頭県土 整備事務所	八東川河川改修工事(大 隼橋下部工)(交付金)	八頭郡 八頭町 市谷 ～ 福井	山陰建設株式会社 代表取締役 上田 正人	(当初契約額) 118,800,000円	令和6年11月6日 ～ 令和7年7月30日	(当初契約年月日) 令和6年11月6日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和7年3月14日	完成部分の引渡しに伴う 既完部分の一部内容 の変更
					(変更後工期) 令和8年1月13日	(第2回変更契約年月日) 令和7年7月18日	橋台工について、支持層 が想定と異なっていたた めその対応に不測の日 数を要したことによる工 期の延伸
					(変更後工期) 令和8年3月23日	(第3回変更契約年月日) 令和8年1月13日	関連工事との工程調整 による工期の延伸
			(第4回変更後契約額) 128,535,000円 (変更額) { 9,735,000円 }			(第4回変更契約年月日) 令和8年3月23日	基礎杭の支持層見直し に伴う杭長の変更による 工事費の増
河川課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	水貫川河川改修工事(6 工区)(補助)	米子市 皆生新田	株式会社三徳興産 代表取締役 長谷川 智也	(当初契約額) 191,730,000円	令和7年1月23日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和6年12月20日	-
					(変更後工期) 令和8年8月28日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	堤防掘削時の湧水対策 に不測の日数を要したこ とによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	賀祥ダム管理用制御処 理設備更新工事(国補 正)	西伯郡 南部町 下中谷	協和テクノロジーズ株式会社 岡山事業所 板倉 史亨 岡山事業所 板倉 史亨	(当初契約額) 179,410,000円 (第1回変更後契約額) 238,293,000円 (変更額) 〔 58,883,000円 〕	令和6年3月25日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和6年3月22日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月6日	- ダム管理用設備の更新 において、人手困難な保 守部品があることが判明 したことに伴い、安定運 用のため既設流用予定 の機器を更新する必要 が生じたことによる工事 費の増
治山砂防課 (鳥取県土 整備事務所)	浦富地区復旧治山工事 (2工区)	岩美郡 岩美町 浦富	株式会社田中組 弘文 代表取締役 田中 弘文	(当初契約額) 89,650,000円 (第1回変更後契約額) 131,046,300円 (変更額) 〔 41,396,300円 〕	令和7年4月18日 ～ 令和7年12月15日 (変更後工期) 令和8年2月25日	(当初契約年月日) 令和7年4月18日 (第1回変更契約年月日) 令和7年11月7日	- ・3次元測量及び設計 データ作成費の計上、土 地利用状況を踏まえ吹 付法砕工を追加施工し たことによる工事費の増 ・吹付法砕工の追加施 工による工期の延伸
				(変更後工期) 令和8年3月16日	(第2回変更契約年月日) 令和8年2月24日	降雪により、吹付法砕工 の工程が遅延したこと による工期の延伸	
				(第3回変更後契約額) 136,478,100円 (変更額) 〔 5,431,800円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年3月11日	工事進捗に伴い、借地 箇所の復旧を本工事で 追加実施したことによる 工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 〔鳥取県土整備事務所〕	北村地区災害関連緊急 治山工事	鳥取市 河原町 北村	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	(当初契約額) 168,520,000円	令和6年9月11日 ～ 令和7年3月24日	(当初契約年月日) 令和6年9月11日	-
				(第2回変更後契約額) 203,105,100円 〔(変更額) 34,585,100円〕	(変更後工期) 令和8年1月30日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月21日	他工事との工事関係車 両の通行調整に伴い、コ ンクリートの日当たり打 設量を減少したことによ る工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 163,220,200円 〔(変更額) △39,884,900円〕	(変更後工期) 令和8年3月25日	(第2回変更契約年月日) 令和7年12月3日	・掘削面からの湧水に伴 い、斜面崩落抑制対策を 追加実施したことによる 工事費の増 ・上記に伴う工期の延伸
治山砂防課 〔鳥取県土整備事務所〕	見生寺谷川砂防工事(堰 堤工)(2工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 紙屋	大和建設株式会社 取締役社長 影井 一清	(当初契約額) 121,990,000円	令和7年3月31日 ～ 令和8年1月5日	(当初契約年月日) 令和7年3月28日	-
				(第2回変更後契約額) 143,079,200円 〔(変更額) 21,089,200円〕	(変更後工期) 令和8年3月27日	(第1回変更契約年月日) 令和7年12月23日	他工事との工程調整に より建設残土の受入時 期が遅延したことによる 工期の延伸
						(第2回変更契約年月日) 令和8年3月16日	3次元起工測量結果に 基づき、本堤コンクリート 及び埋戻コンクリートの 打設量が増えたことによ る工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 〔八頭県土整備事務所〕	櫛谷川通常砂防工事(交付金)	八頭郡 智頭町 智頭	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 87,450,000円	令和7年4月21日 ～ 令和7年12月22日	(当初契約年月日) 令和7年3月5日	-
				(第1回変更後契約額) 101,503,600円 〔変更額〕 〔14,053,600円〕	(変更後工期) 令和8年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和7年12月22日	・伐木量が当初想定より増えたこと等による工事費の増 ・上記の伐木量増に伴う工程見直しによる工期の延伸
治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	横手2地区復旧治山工事(3工区)(国補正)	東伯郡 三朝町 横手	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	(第2回変更後契約額) 101,722,500円 〔変更額〕 〔218,900円〕	(変更後工期) 令和8年6月10日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月10日	・大雪により工事用道路等の除雪、排雪対応に伴う工事費の増 ・大雪により砂防ソイルセメントの施工効率低下に伴う工期の延伸
				(当初契約額) 142,780,000円	令和7年4月1日 ～ 令和8年1月9日	(当初契約年月日) 令和7年3月7日	-
				(第1回変更後契約額) 139,542,700円 〔変更額〕 〔△3,237,300円〕	(変更後工期) 令和8年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月6日	・8月から10月に局所的な大雨が繰り返し降り、法面の崩壊箇所復旧等に追加の期間を要したことに伴う工期の延伸 ・残工事に必要な工期の確保が困難となるため、吹付砕砕工の数量を減じたこと等による工事費の減
						(第2回変更契約年月日) 令和8年3月19日	工事中間流用のために土砂搬出先を変更したほか、現地精査に伴うその他の数量の変更

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】		県土整備部					
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 (中部総合事務所) (県土整備局)	坂本地区復旧治山工事 (2工区)(国補正)	東伯郡 三朝町 坂本	株式会社高野組 代表取締役 高力 久美	(当初契約額) 71,500,000円 (第1回変更後契約額) 103,075,500円 (変更額) 〔 31,575,500円 〕	令和7年4月1日 ～ 令和7年12月10日 (変更後工期) 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年3月14日 (第1回変更契約年月日) 令和7年12月4日	- ・ICT活用工事(受注者希望型)の実施等による工事費の増 ・借地箇所(工事用道路)の復旧方法について地権者との調整に期間を要したこと等による工期の延伸 借地箇所(農地)の復旧について、石礫等の除去に期間を要したことによる工期の延伸
治山砂防課 (西部総合事務所) (日野県土整備局)	大谷砂防堰堤工事(法面工)	日野郡 日南町 丸山	有限会社原明建設 代表取締役 原明 幸路	(当初契約額) 80,960,000円 (第1回変更後契約額) 101,475,000円 (変更額) 〔 20,515,000円 〕	令和7年9月5日 ～ 令和8年3月16日	令和7年9月5日 (第1回変更契約年月日) 令和8年3月6日	- ICT活用工事(受注者希望型)の実施及び準備工 伐採に係る処分量の増 加による工事費の増
